

# Формирование команды проекта и распределение ролей

Руководитель проекта определяет требования к уровню владения компетенциями для администратора проекта, специалистов, ответственных за реализацию отдельных мероприятий (работ) проекта, специалистов, ответственных за реализацию блока мероприятий (работ) проекта, специалиста – оператора мониторинга проекта



## КОМАНДА ПРОЕКТА

### ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

#### Куратор проекта

*(высшее должностное лицо ВО, вице-Губернатор, первый заместитель Губернатора, заместитель Губернатора, зам.руководителя аппарата Губернатора или работник ОИВ/ОМС)*

#### Руководитель проекта

*(работник оив/омс)*

#### Администратор проекта

*(работник оив/омс)*

Специалист, ответственный за реализацию блока мероприятий (работ) проекта  
*(работник оив/омс/хоз.субъекта)*

Специалист, ответственный за реализацию отдельных мероприятий (работ) проекта  
*(работник оив/омс/хоз.субъект)*


Специалист - оператор мониторинга проекта  
*(работник оив/омсу)*

### РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА

# Схема коммуникации в ходе реализации проекта


## Уровень 1.

Уровень принятия управленческих решений

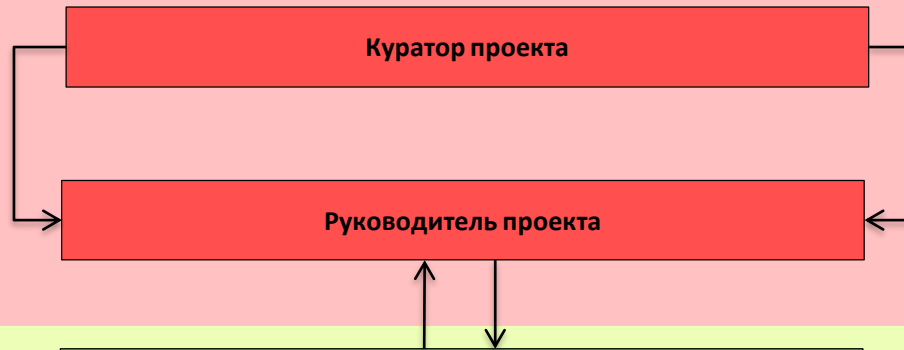


## Уровень 2.

Уровень обработки первичной информации, ее систематизации и подготовки управленческих решений

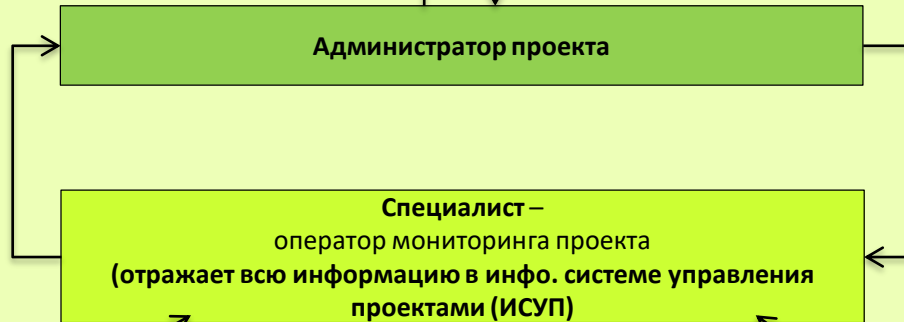

## Уровень 3.

Уровень сбора первичной информации



## Уровень 4.

Уровень непосредственного выполнения работ

